SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
DEZ-B-NUO-001	Ingegneria naturalistica	2	3	3	8	Alta	€ 215.000,00
DEZ-B-NUO-002	Briglia	2	3	2	7	Alta	€ 1.500.000,00
DEZ-B-NUO-003	Ingegneria nat./Scogliera	2	3	1	6	Media	€ 285.000,00
DEZ-B-NUO-004	Briglia/Scogliere	2	2	1	5	Alta	€ 80.000,00
DEZ-B-NUO-005	Vasca di accumulo	3	3	1	7	Alta	€ 60.000,00
DEZ-B-NUO-006	Scogliere	1	1	1	3	Bassa	€ 130.000,00
DEZ-B-NUO-007	Briglia	1	2	1	4	Media	€ 380.000,00
DEZ-B-NUO-008	Briglie	1	3	2	6	Media	€ 180.000,00
DEZ-B-NUO-009	Ingegneria naturalistica	1	3	1	5	Media	€ 300.000,00


Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
DEZ-B-RIP-001	Sottomurazione	2	3	3	8	Alta	€ 230.000,00
DEZ-B-RIP-022	Muro d'argine	3	3	2	8	Alta	€ 430.000,00
DEZ-B-RIP-036	Briglia	2	2	2	6	Media	€ 150.000,00
DEZ-B-RIP-037 a 040	Briglie / Muri d'argine	-	-	-	-	-	-
Note:	*Opere già realizzate*						
DEZ-B-RIP-060 a 067	Muro d'argine / Gabbioni	2	2	1	5	Media	€ 345.000,00
DEZ-B-RIP-075 a 081	Briglie	2	2	1	5	Media	€ 165.000,00
DEZ-B-RIP-101 e 102	Soglia e Muro d'argine	2	2	2	6	Alta	€ 35.000,00
DEZ-B-RIP-110	Muro d'argine	1	1	1	3	Bassa	€ 300.000,00

Manutenzioni

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
DEZ-B-MAN-001	Pulizia e svaso	1	2	1	4	Bassa	€ 45.000,00
DEZ-B-MAN-002	Pulizia e taglio vegetazione	2	2	2	6	Alta	€ 45.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL FIUME DEZZO	€ 4.665.000,00

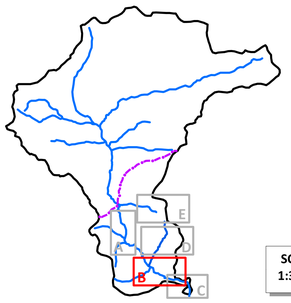

SCALA 1:3.500

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

DEZ... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- *3 = Danni gravissimi*
- *2 = Danni consistenti*
- *1 = Danni lievi*

II = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- *3 = Alto*
- *2 = Medio*
- *1 = Basso*

III = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- *3 = Linea rete viaria o principale - Ferrovia*
- *2 = Strade secondarie o locali*
- *1 = Assenza di infrastrutture viarie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- *8–9 = Alta*
- *5–7 = Media*
- *3–4 = Bassa*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22619
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)*

II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)*

III° LOTTO ***(dati aggiornati al giugno 2012)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	FIUME DEZZO *Porzione in provincia di Brescia*	76	DEZ

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		A B C D E
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l. GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Mandiaturo, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

