SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
TFA-C-NUO-001	Scogliere/Riprofilatura alveo/Selciato	3	3	2	8	Alta	€ 190.000,00
TFA-C-NUO-002	Soglie/Alveo canalizzato	-	-	-	-	-	-


Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
TFA-C-RIP-012	Impalcato ponte	1	1	1	3	Bassa	€ 10.000,00
TFA-C-RIP-015	Impalcato ponte	1	1	1	3	Bassa	€ 25.000,00

Manutenzioni

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
TFA-C-MAN-001	Taglio e sfalcio vegetazione	1	2	2	5	Alta	€ 25.000,00
TFA-C-MAN-002	Taglio e sfalcio veg./svaso	1	2	1	4	Media	€ 40.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE FA	€ 290.000,00

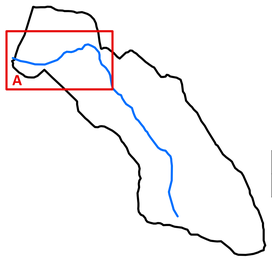

SCALA 1:1.500

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

TFA_ = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I_= Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- *3 = Distruzione totale*
- *2 = Danni consistenti*
- *1 = Danni lievi*

II_= Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- *3 = Alto*
- *2 = Medio*
- *1 = Basso*

III_= Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- *3 = Infrastrutture viarie o principale – Ferrovia*
- *2 = Strade secondarie o locali*
- *1 = Assenza di infrastrutture varie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- *8–9 = Alta*
- *5–7 = Media*
- *3–4 = Bassa*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)* | II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)* | **III° LOTTO** ***(dati aggiornati al gliglio/3 2012)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	TORRENTE FA	60	TFA

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		A
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO srl
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340021* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

TFA-C-NUO-001
I : 3
II : 3
III: 2

Priorità: 8
Strategicità: Alta

TFA-C-NUO-002
I : -
II : -
III: -

Priorità: -
Strategicità: -

TFA-C-RIP-012
I : 1
II : 1
III: 1

Priorità: 3
Strategicità: Bassa

TFA-C-MAN-001
I : 1
II : 2
III: 2

Priorità: 5
Strategicità: Alta

TFA-C-RIP-015
I : 1
II : 1
III: 1

Priorità: 3
Strategicità: Bassa

TFA-C-MAN-002
I : 1
II : 2
III: 1

Priorità: 4
Strategicità: Media

TFA-C-NUO-001 I : 3 II : 3 III: 2 ---------- Priorità: 8 Strategicità: Alta
TFA-C-NUO-002 I : - II : - III: - ---------- Priorità: - Strategicità: -
TFA-C-RIP-012 I : 1 II : 1 III: 1 ---------- Priorità: 3 Strategicità: Bassa
TFA-C-MAN-001 I : 1 II : 2 III: 2 ---------- Priorità: 5 Strategicità: Alta
TFA-C-RIP-015 I : 1 II : 1 III: 1 ---------- Priorità: 3 Strategicità: Bassa
TFA-C-MAN-002 I : 1 II : 2 III: 1 ---------- Priorità: 4 Strategicità: Media
